

# Ferwâlde te Plak!

## Nijs fan 'e Finne-Ferboukommisje



Januari 2021 (3)

Afgelopen week (de week van 18 januari '21) stond vooral in het teken van de keuken en de heren wc.

In de keuken zijn opstaande randen (plinten) gemaakt waarop straks het keukeninterieur wordt geplaatst. De epoxy gietvloer komt ook tegen deze plinten op. Ook is de 'fundatie' voor de afwasmachine en de koel/vriescombinatie gemaakt. De tegelzetter is vrijdag 22 januari begonnen met het betegelen van de wanden van de keuken!


Het kozijn van het voormalige middenlokaal wordt hergebruikt en gaat nu dienst doen als toegangsdeur voor de heren wc. De reservoirs voor de twee urinoirs zijn geplaatst en de wand is verder opgetrokken. Ook is de vloer met beton aangevuld op de plekken waar we de muurtjes hebben gesloopt en het kozijn is weggehaald.




*De contouren van het nieuwe herentoilet worden zichtbaar...*




*De ingang van de heren wc...*

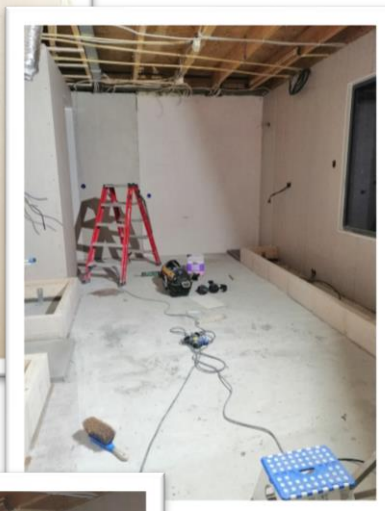

*Klaar om betegeld te worden....*

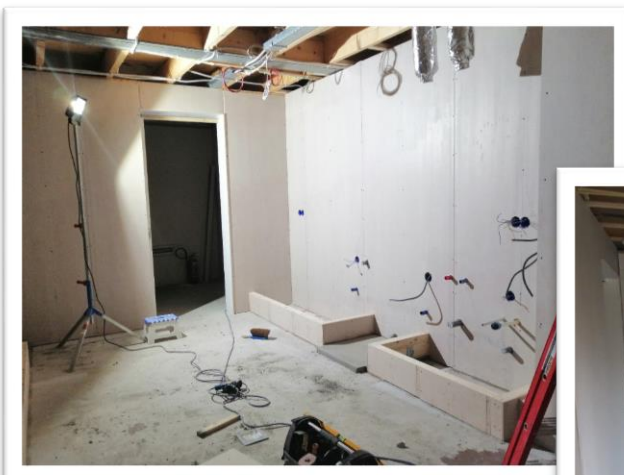

*De opstaande plinten met in de midden de ruimte voor de afwasmachine...*

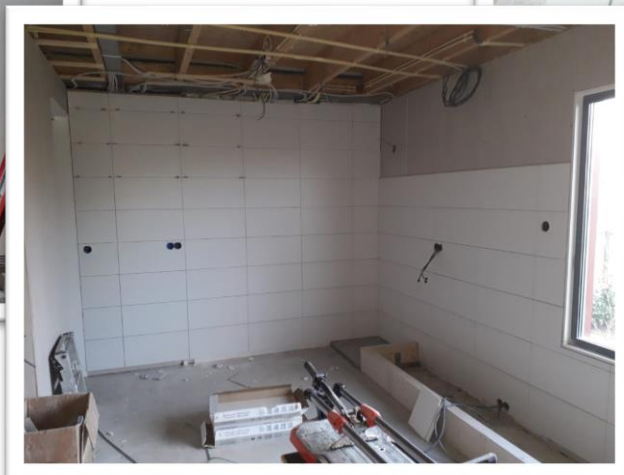

*Avensearje-tegels: het resultaat van één dag tegelzetten...*

Met groet, de Verbouwcommissie: Evert-Jan, Coba, Johan Willem, Tjeerd, Durk, Gertrud, Marten en Willie
