

Ferwâlde te Plak!


Nijs fan 'e Finne-Ferboukommisje



Januari 2021 (4)

Alweer de vierde week... Afgelopen week (de week van 25 januari '21) stond vooral in het teken van tegelzetten en aftimmeren. De keuken en de heren wc zijn inmiddels volledig betegeld en van voegwerk voorzien. Het urinoir wat in het invalidentoilet zat, is verwijderd om zo straks aan alle eisen voor integrale toegankelijkheid te voldoen. Hier is het tegelwerk aangevuld op de plek waar het urinoir zat. De gipswanden zijn afgewerkt en de deurposten zijn afgetimmerd en klaar voor de schilder.

Het kozijn van de voormalige directiekamer is hergebruikt en gaat nu dienst doen als kastdeur. Achter de heren wc bleef in het ontwerp nl. een klein hoekje over, precies genoeg voor een kast bedachten wij.

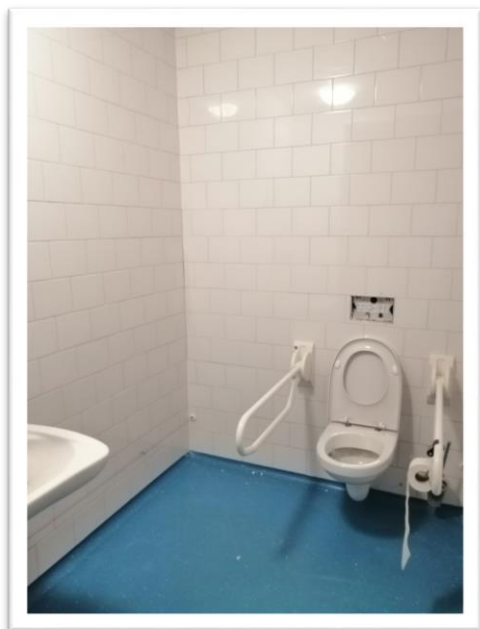

Het MiVa-toilet zonder urinoir zodat de wc straks ook via de zijkant bereikbaar is...



De keuken compleet in de tegels – zicht op het 'vuile' gedeelte van de keuken...



De nieuwe kast met 'directie' kozijn...



De heren wc betegeld met dezelfde tegel als dames- en MiVa-toilet...



Sa wurdt it: schetsontwerp van het 'vuile' gedeelte van de keuken...
