

# Ferwâlde te Plak!

## Nijs fan 'e Finne-Ferboukommisje



Februari 2021 (1)

Deze week (de week van 1 februari '21) is de Epoxy gietvloer in de keuken, de berging (beide middengrijs met groene en lichtgrijze accenten) en het herentoilet (blauw met gele en witte accenten) gelegd. De bovenlaag van het damestoilet is ook meegenomen, zodat de vloer één geheel wordt. 4 Lagen in totaal, verspreid over 4 dagen. Het vloerenbedrijf bleek een bekende met het gebouw: hij heeft destijds ook de gietvloer van de school gedaan.


Verder willen we alvast aankondigen dat binnenkort een zeecontainer bij De Finne wordt neergezet. Dit is van tijdelijke aard. Hier willen we zoveel mogelijk spullen in kwijt, het idee is dat alleen de biljarten nog in de Finne staan, zodat de vloer kan worden geëgaliseerd ter voorbereiding van de nieuwe pvc-vloer.




*Ook de deur van de nieuwe kast is inmiddels afgehangen...*

*Sa wurdt it: schetsontwerp van het 'schone' gedeelte van de keuken...*

*De voorbereidende laag van de Epoxy gietvloer – v.l.n.r. berging –doorgang berging/keuken en keuken...*

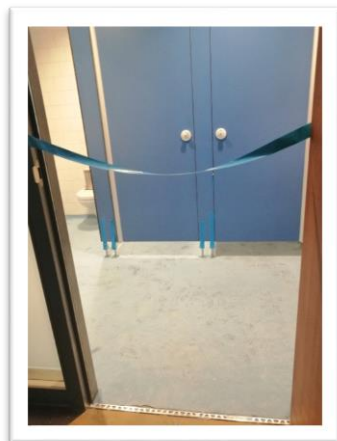

*Vloer damestoilet opgeschuurd en van nieuwe eindlaag voorzien.....*

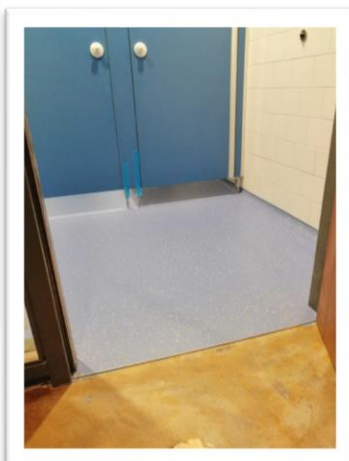

Met blauw en grijze groet, de Verbouwcommissie:  
Evert-Jan, Coba, Johan Willem, Tjeerd, Durk, Gertrud, Marten en Willie

*Vloer herentoilet...*
