


Ferwâlde te Plak!

Nijs fan 'e Finne-Ferboukommisje (15)





Maart 2021 (3)


Afgelopen week, de week van 15 maart, niet heel veel drukte in De Finne, maar zeker wel daar buiten: bij Jelle's in Greonterp wordt gewerkt aan de planken die straks op de achterwand van de bar komen. Verder wachten we op de rest van de levering van de verlichting en dan kunnen we daar ook mee starten. Ondertussen komt De Roos zo nu en dan weer even wat installatiewerk afmaken en staan de nieuwe meubelen op afroep bij de leveranciers 😊.

Het geluidssysteem is verder afgemaakt door Roelof de Jong van Disco Silver: de ringleiding, boxen, de microfoons, internetradio/spotify connect/MP3 Bluetooth zijn nu allemaal ingeregeld. Ook is er een extra aansluitpunt voor de beamer gecreëerd. Dus ook dit onderdeel kan worden afgevinkt!

Afgevinkt:
Ringleiding &
Geluidssysteem!

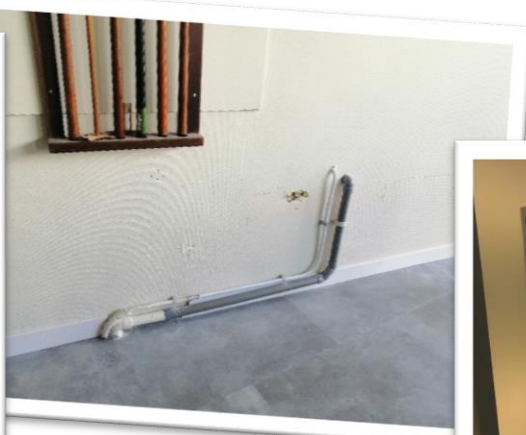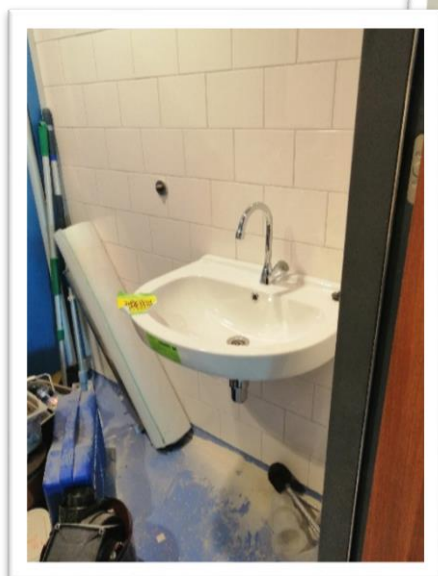

*Nieuwe wastafel in het damestoilet.
De aan- en afvoer van de nieuwe
wastafel is opgepakt vanaf het vm
keukenblokje wat eerder dienst deed
in het lokaal voor groep 6-7-8, nu
biljartruimte...*

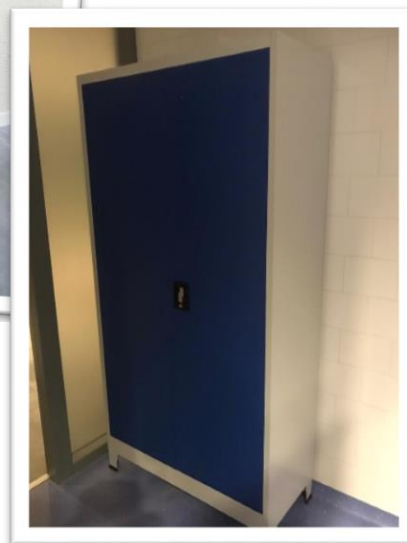

*In het herentoilet een locker voor
toiletpullen...*



*Begin maart al gerealiseerd, maar nog niet
laten zien: de stenen muurtjes zijn omkleed met
hetzelfde hout als de bar, zo komt het hout in
elke ruimte terug en wordt het een mooi geheel...*



In afwachting en met groet, de Verbouwcommissie:
Evert-Jan, Coba, Johan Willem, Tjeerd, Durk, Gertrud, Marten en Willie
